


川口小学校

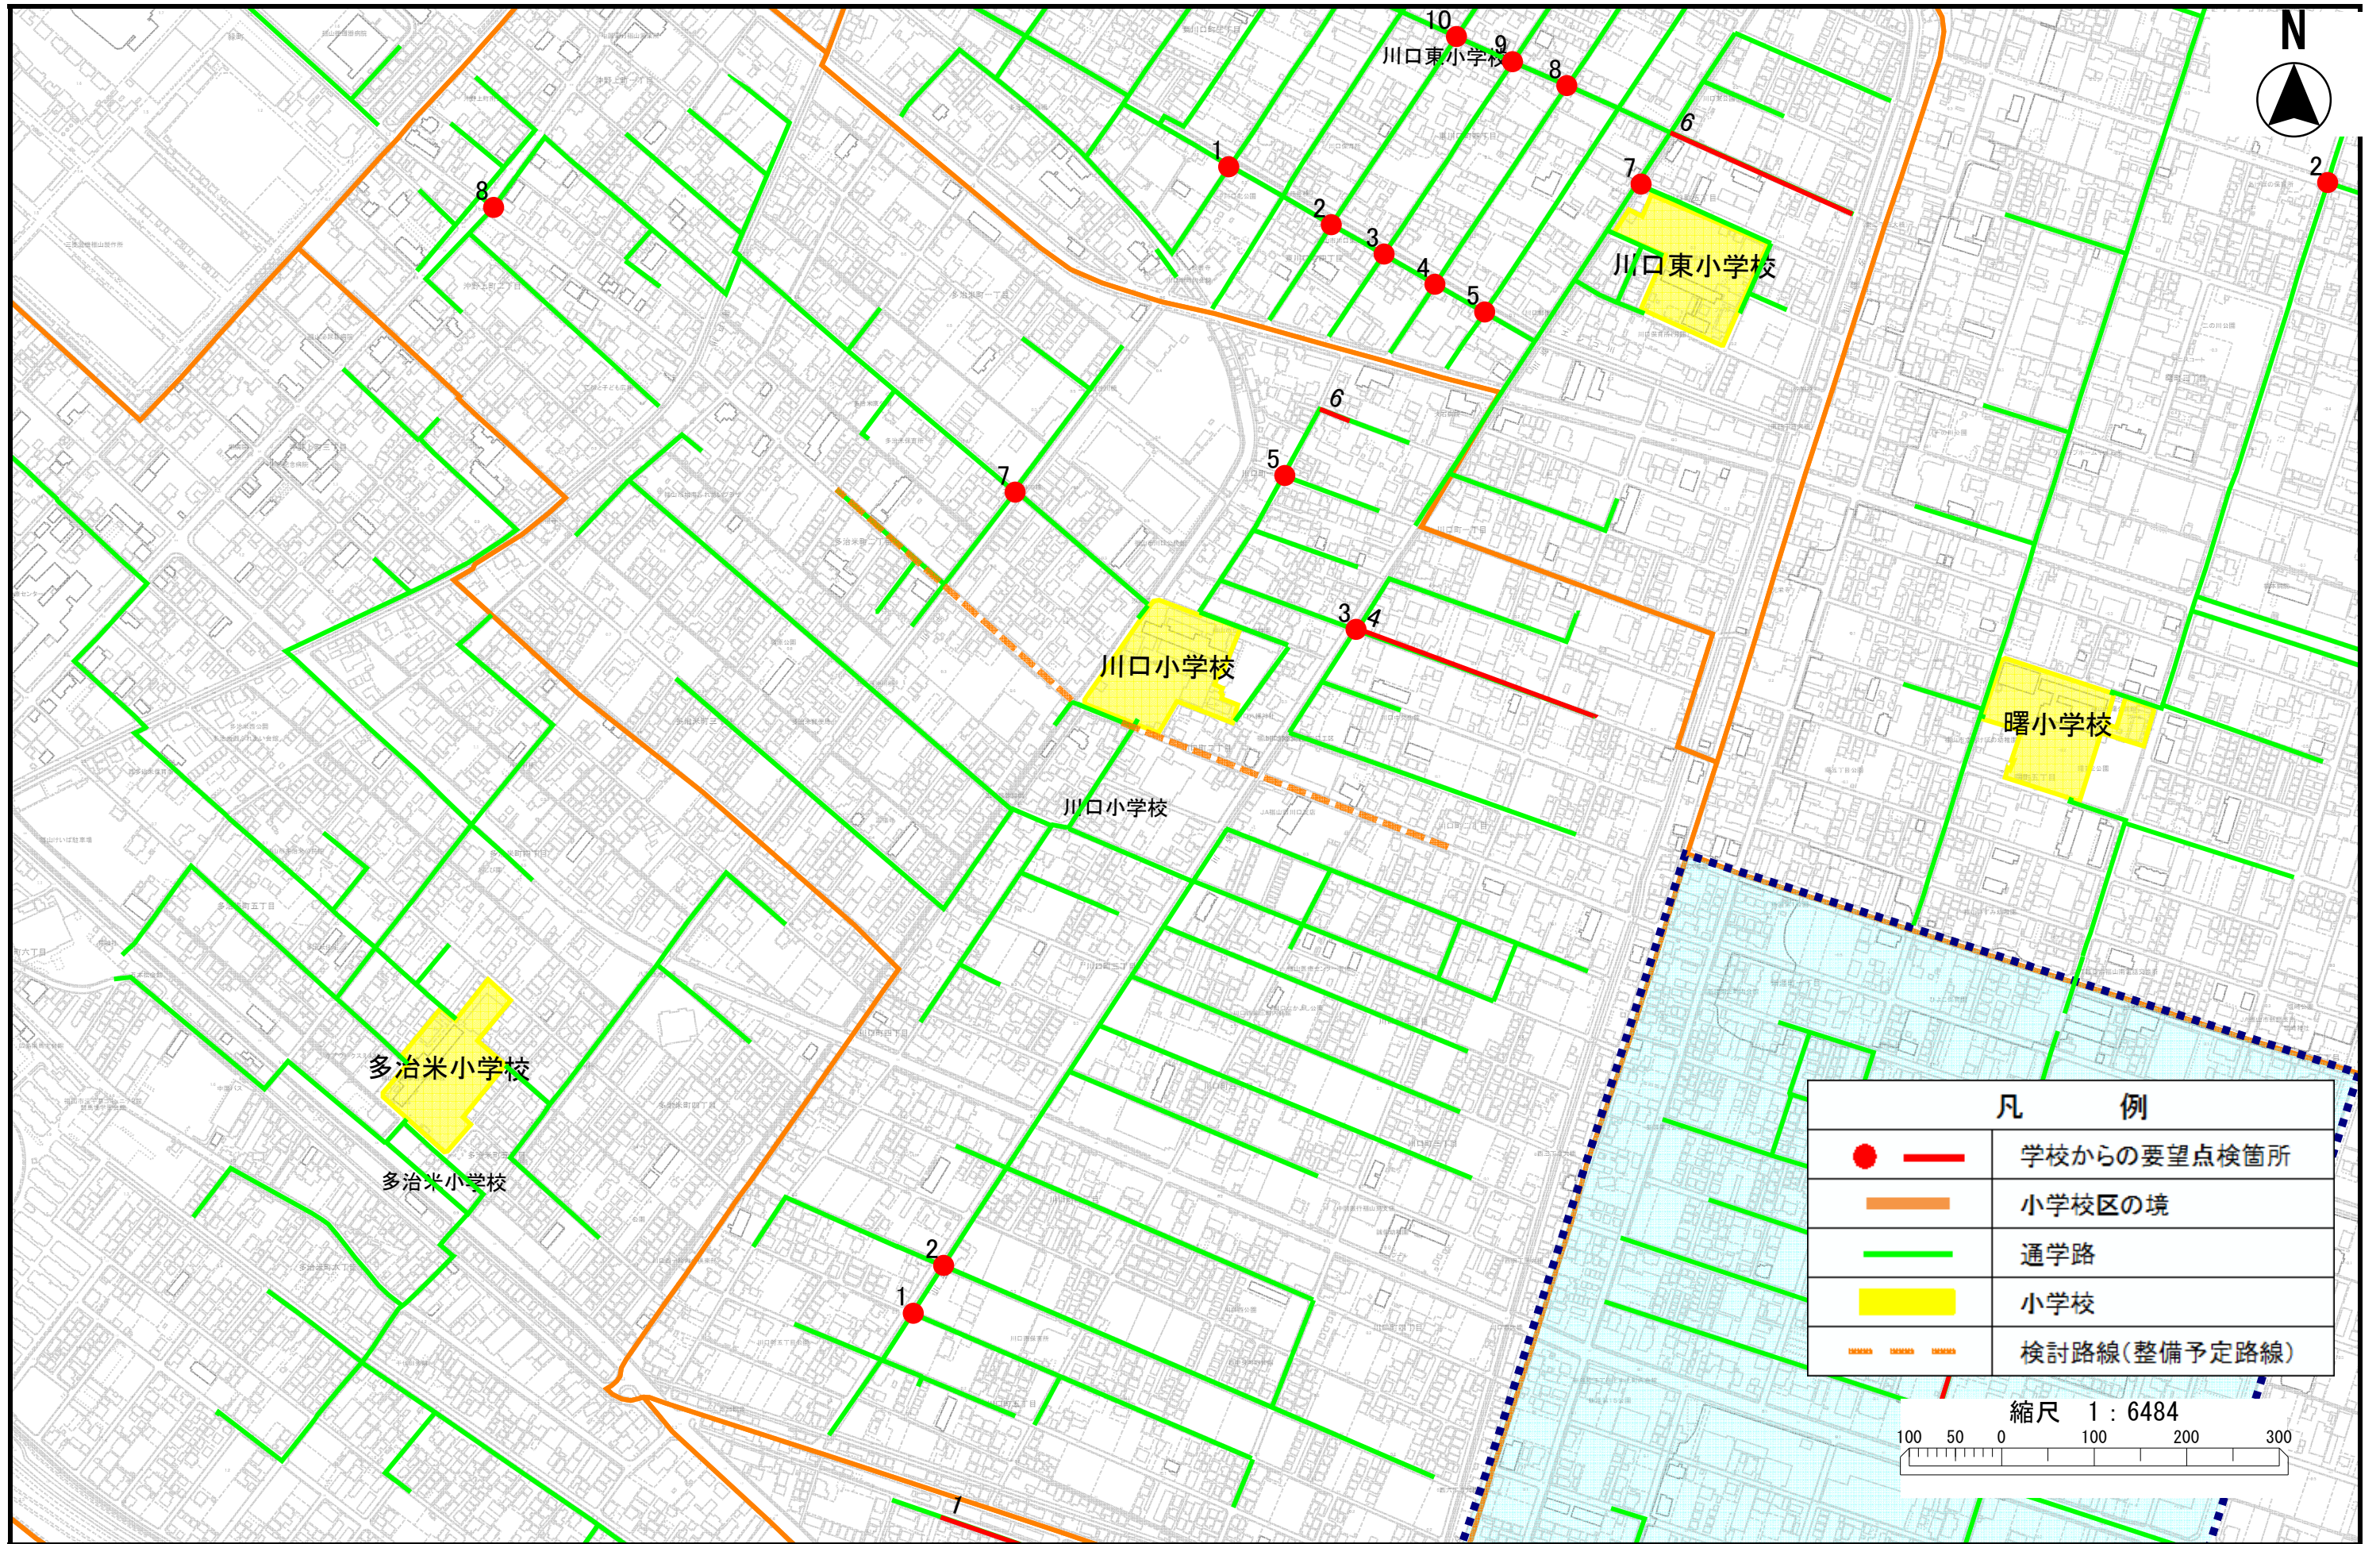

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
川口	1	2020	住宅が新築され、左右からの歩行者等が見えにくい ため、危険である。	対策可	【市】 ドット線の設置	点検内容がすべて対応完了	
川口	2	2020	停止線と「止まれ」の標示が消えかかっている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
川口	3	2020	横断者の溜まり場がない上に、側溝もあり危険であ る。(横断歩道の位置をずらせないか。)	対策可	【市】 水路への蓋掛け ポストコーンの設置	対応中	水路への蓋掛けに際し、用水路 の管理者から同意書を取得済み
川口	4	2020	路側帯の標示・「減速」の文字が消えかかっている。	対策可	【市】 路面標示(減速)・外側線の引き 直し	点検内容がすべて対応完了	
川口	5	2020	停止線と「止まれ」の標示が消えかかっている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
川口	6	2020	深い側溝があり、危険である。鉄板がかけてある が、(住宅の完成状況により)側溝への転落防止対 策が必要である。	対策可	【市】 転落防止柵の設置(地域の了承 を得た後)	未対応	
川口	7	2020	交通量が大変多い上、住宅もあり見通しが悪く危険 である。(横断歩道の位置をずらせないか。)	対策可	【市】 路面標示(児童横断あり)の設置 (2箇所)	未対応	

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
川口	8	2018	交通量が多く、車のスピードも出ている。	対策可	【市】 外側線の引き直し	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号1]
